Toots Thielemans Panel

05/10/2022

Chef de Pôle: Laurent Borsellini

M3 Bordet-Albert

MIVB STIB .brussels

beliris POUR BRUXELLES VOOR BRUSSEL

BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

Ordre du jour

1. Avancement du chantier
2. Mesures d’accompagnement
3. Gestion des points d’amélioration

1

Avancement du chantier

Laurent Borsellini

M3 Nord - Albert

MIVB STIB .brussels

béliris POUR BRUXELLES VOOR BRUSSEL

BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

Avancement chantier GC

- **Vue générale**

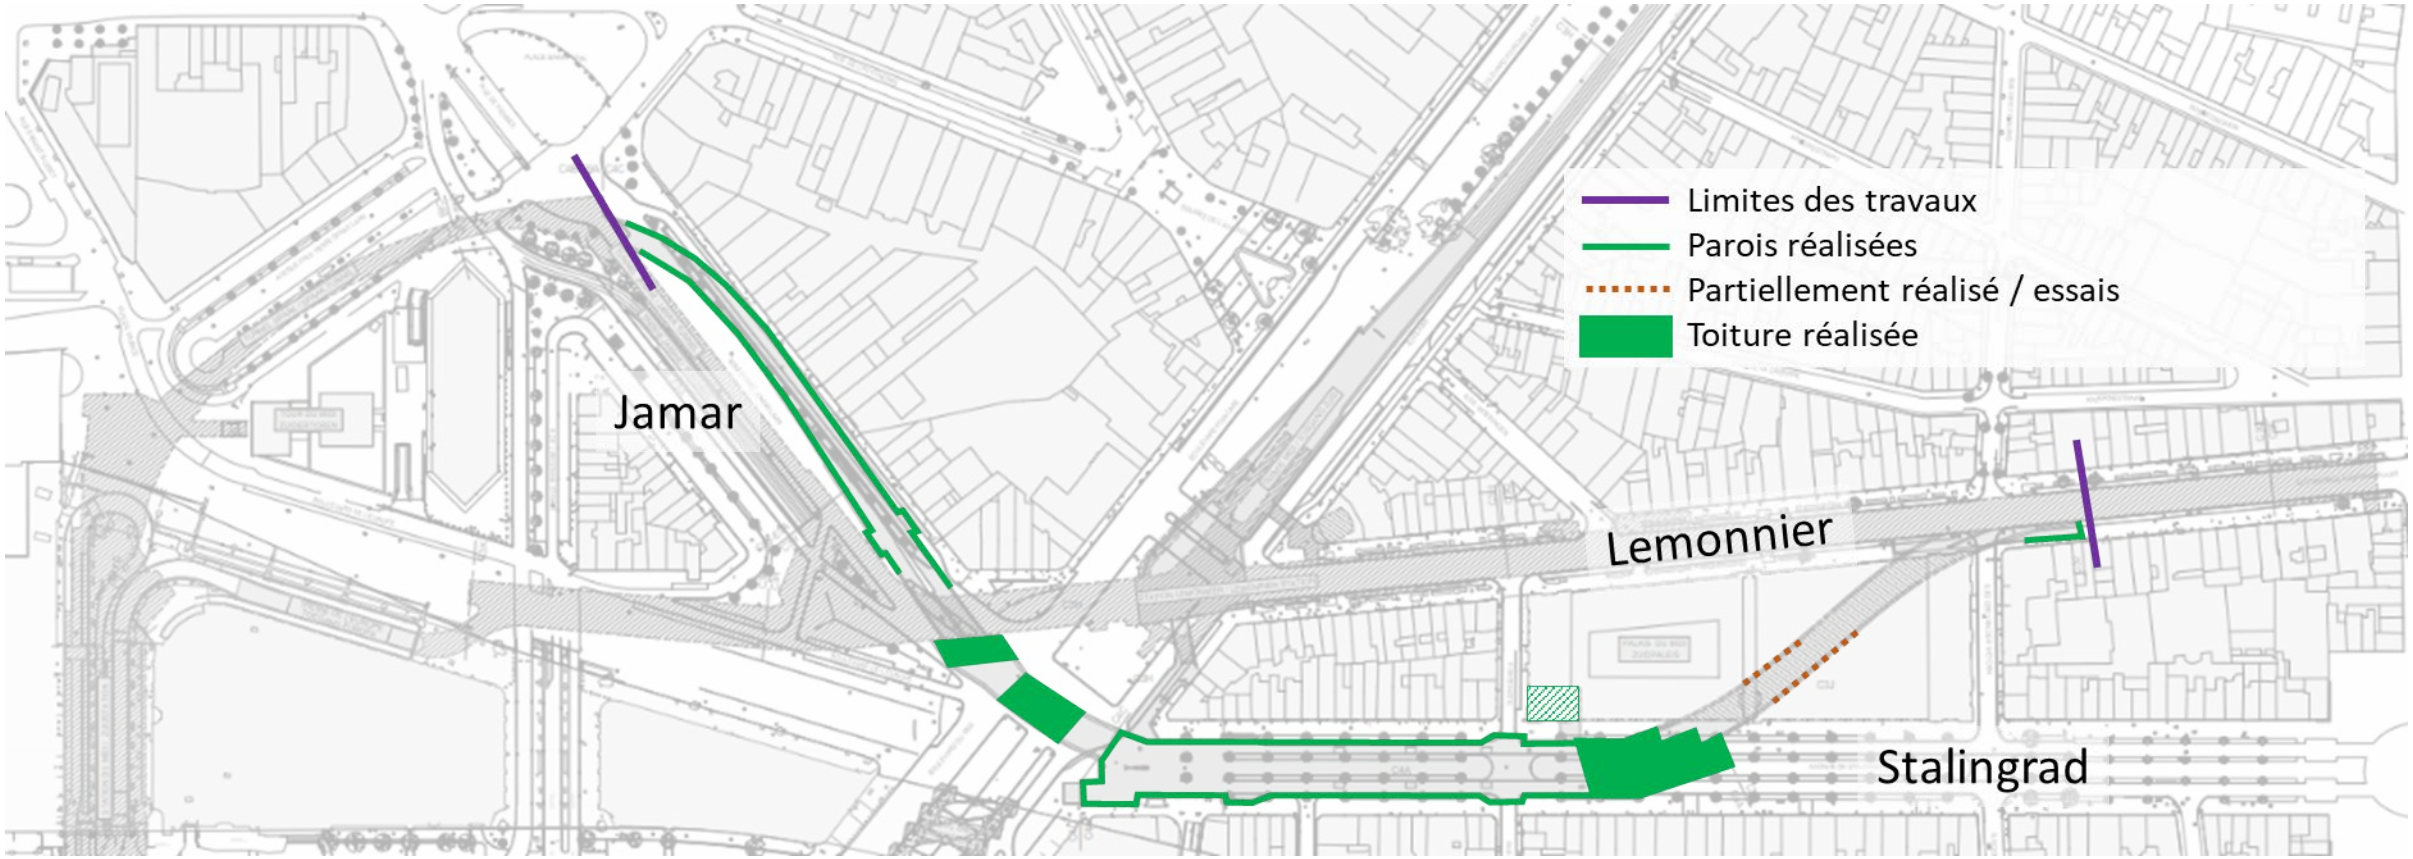

Avancement des travaux

- **Travaux de génie civil : Bd Lemonnier**
  - Fin des travaux d'égout au n°124-130 : fin octobre 2022
  - Reprise des travaux des pieux Kelly devant les n°124-130 et devant le Palais du Midi : mi-novembre 2022

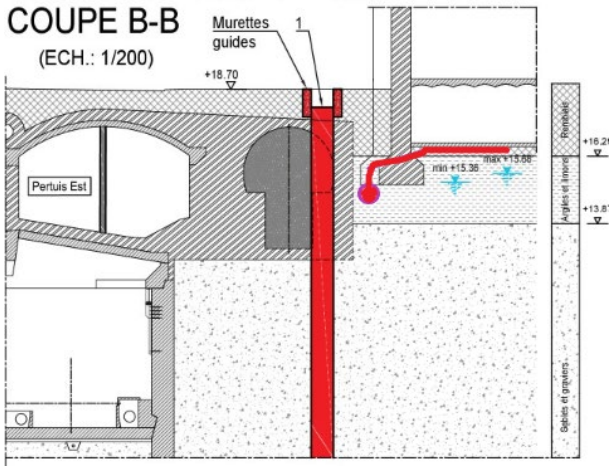

ref PRES

M3 Nord - Albert

Avancement des travaux

- **Travaux de génie civil : Palais du Midi**
  - Tunnel sous le bâtiment : essais d'investigation toujours en cours
  - Entrée nord : Av. de Stalingrad 75 : les travaux de reprise en s/œuvre progressent

ref PRES

Avancement des travaux

- **Travaux de génie civil : Av. de Stalingrad**
  - Réalisation des parois moulées et des barrettes terminée
  - Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées démarrent prochainement dans la section rue Sallaert – Bd du Midi

Avancement chantier GC

- **Av. de Stalingrad**
  - Phasage réalisation dalle de couverture à partir de Q4/2022 jusque Q2/2023

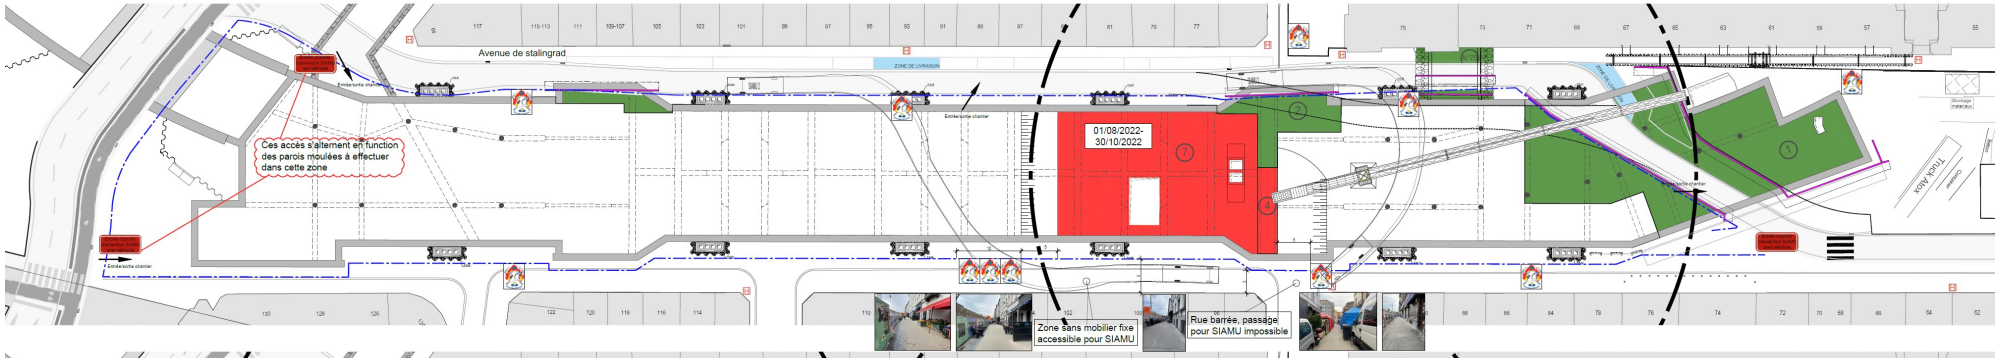

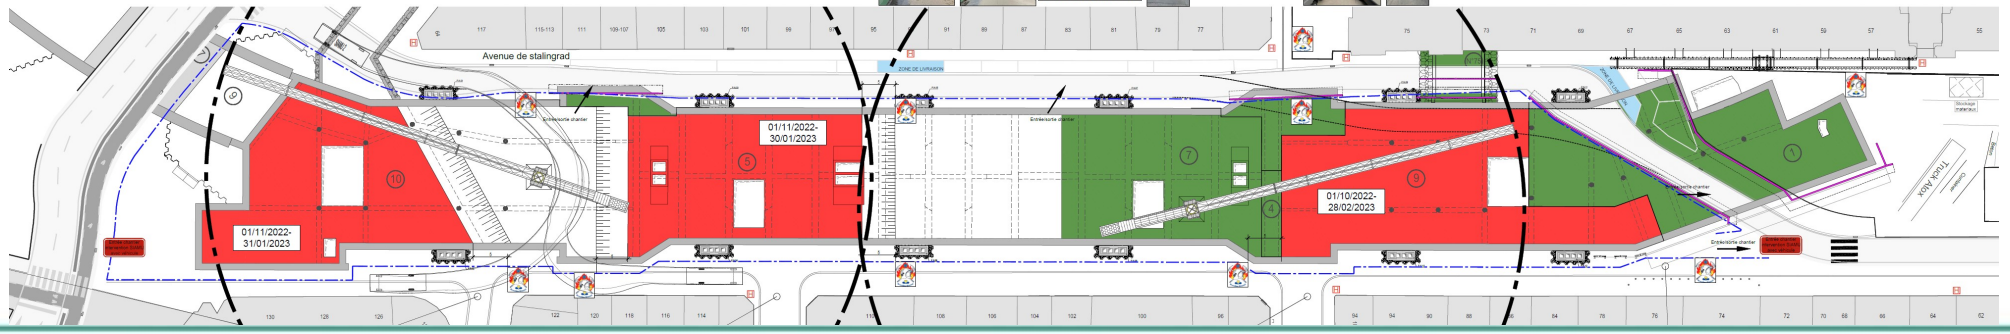

Avancement chantier GC

- **Zone C4A - Av. de Stalingrad**
  - Phasage réalisation dalle de couverture à partir de Q4/2022 jusque Q2/2023

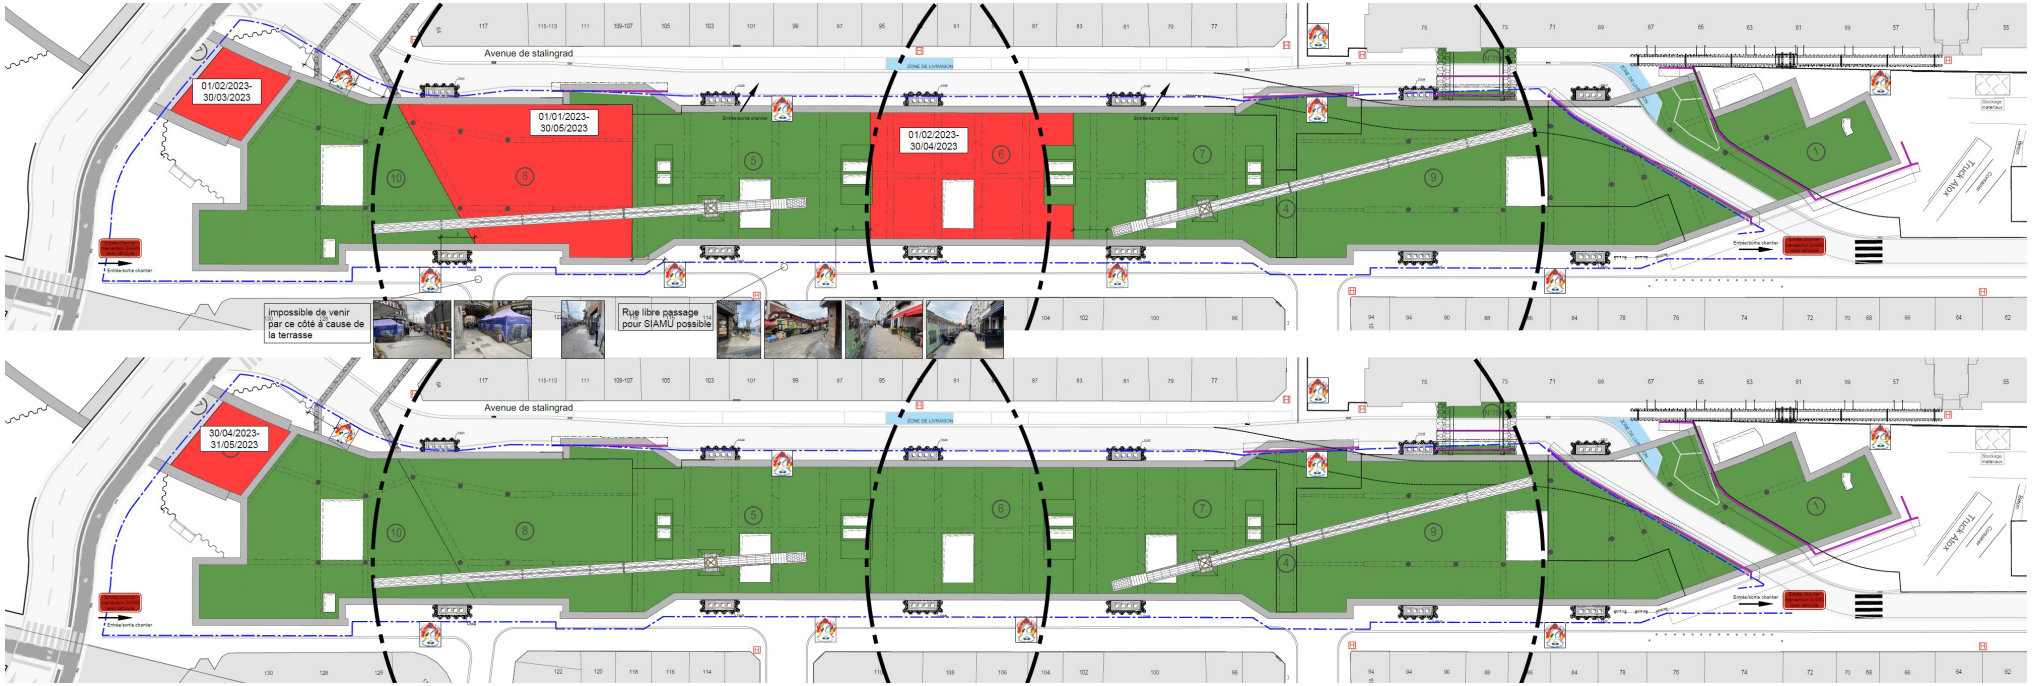

Avancement chantier GC

- **Zone C4A - Av. de Stalingrad**
  - Préparation de la phase 3 (oméga) Q2/2023

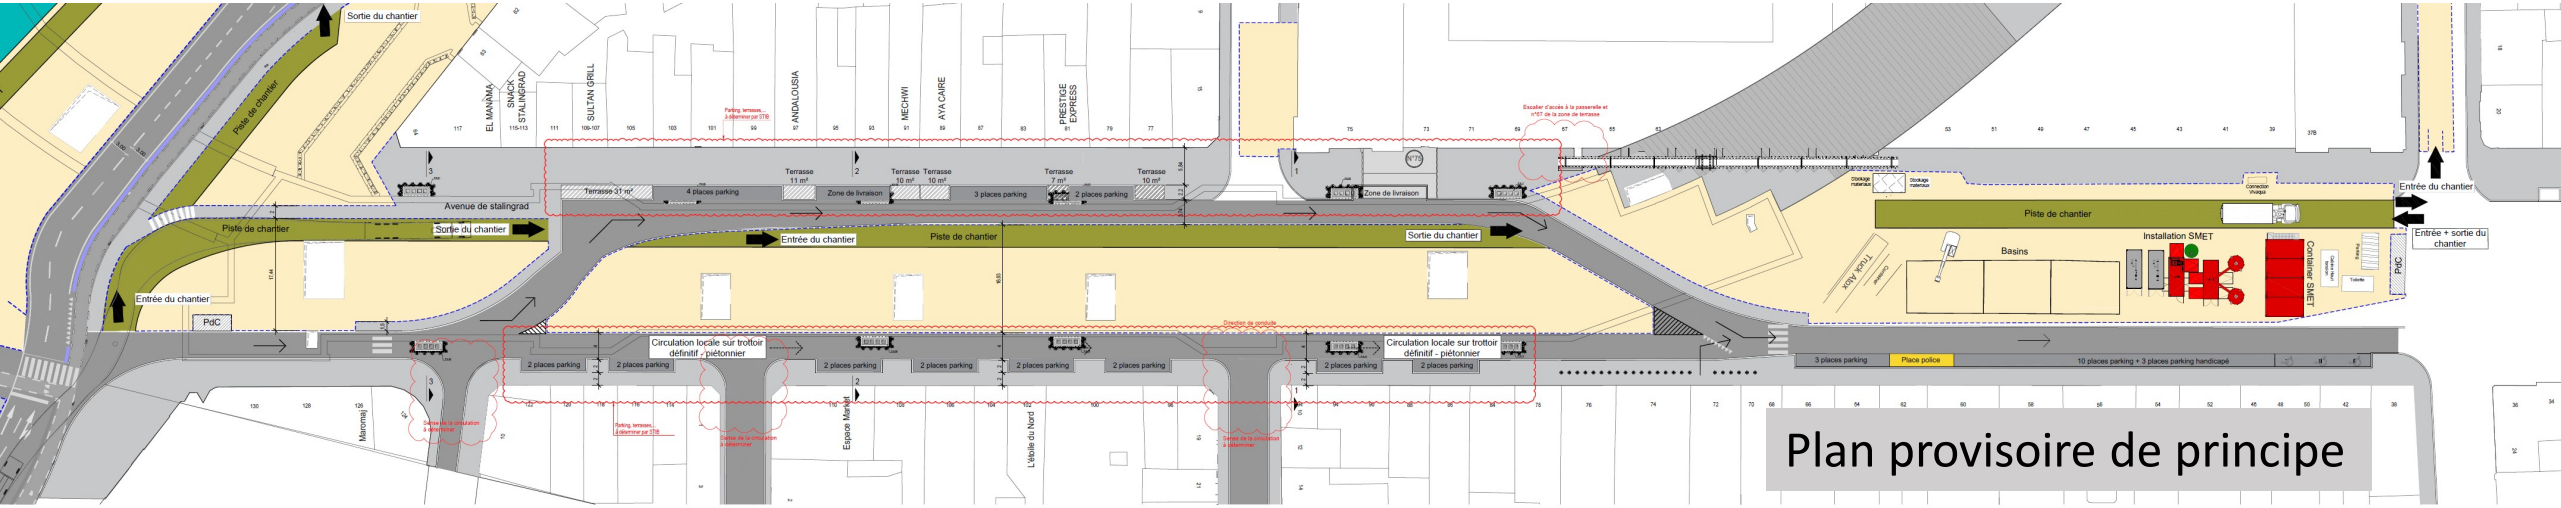

Plan provisoire de principe

Avancement des travaux

- **Travaux de voie : Bd du Midi**
  - Mise en place d'une 3ème voie Bd du Midi pour la base de vie train travaux : en cours, achèvement prévu mi-décembre 2022
  - Utilisation occasionnelle

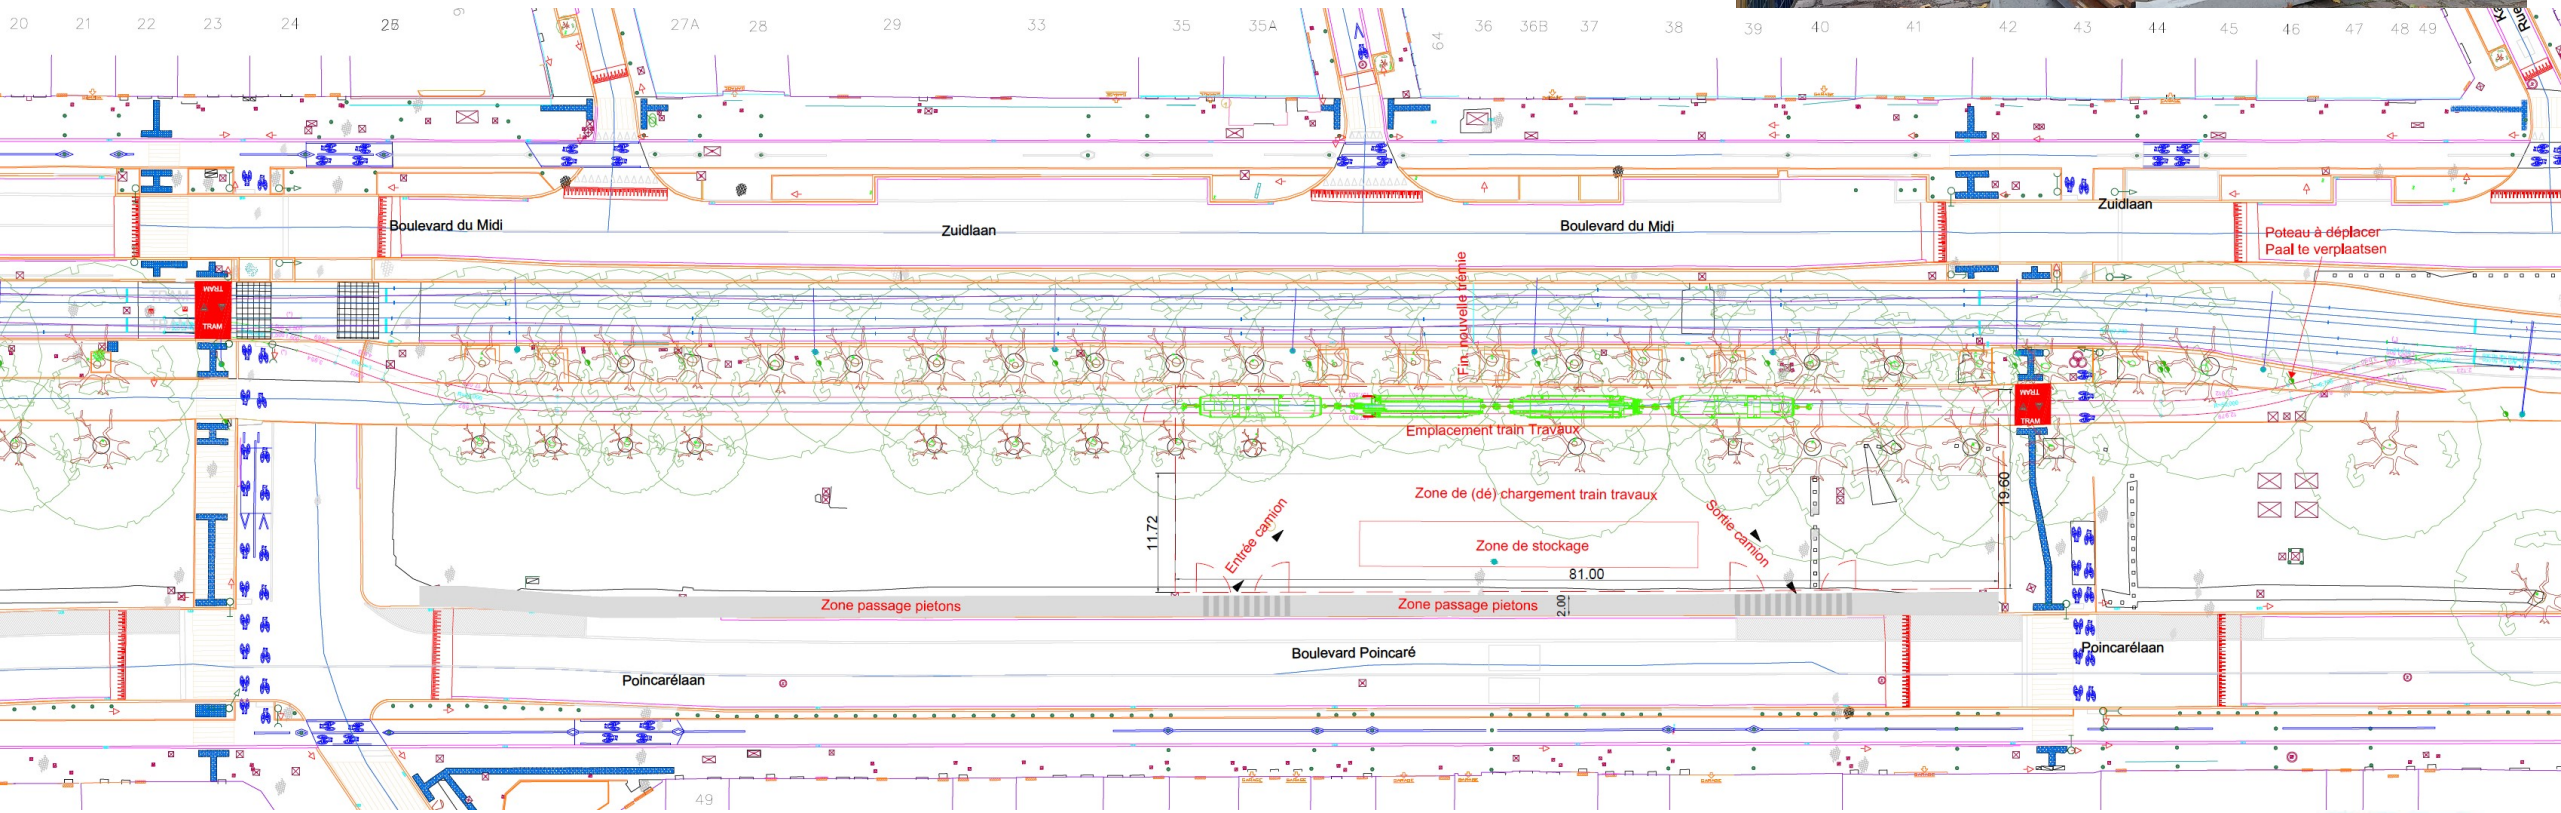

ref PRES

Avancement des travaux

- **Travaux de parachèvements : Bd du Midi 63**
  - Rafraîchissement intérieur : fin de l'intervention fin décembre 2022

ref PRES

Avancement des travaux

- **Travaux de génie civil : Bd du Midi**
  - Réalisation des parois moulées en cours jusqu'en novembre 2022
  - Travaux de recépage des barrettes et des parois moulées démarrent prochainement
  - Préparation de la phase de congélation

ref PRES

Nord - Albert

Avancement des travaux

- **Travaux de génie civil : Bd Jamar**
  - Réalisation des parois moulées achevées
  - Recépage des parois moulées démarrent prochainement

ref PRES

Avancement chantier GC

- **Bd Jamar**
  - Phasage réalisation dalle de couverture Q1-Q2/2023

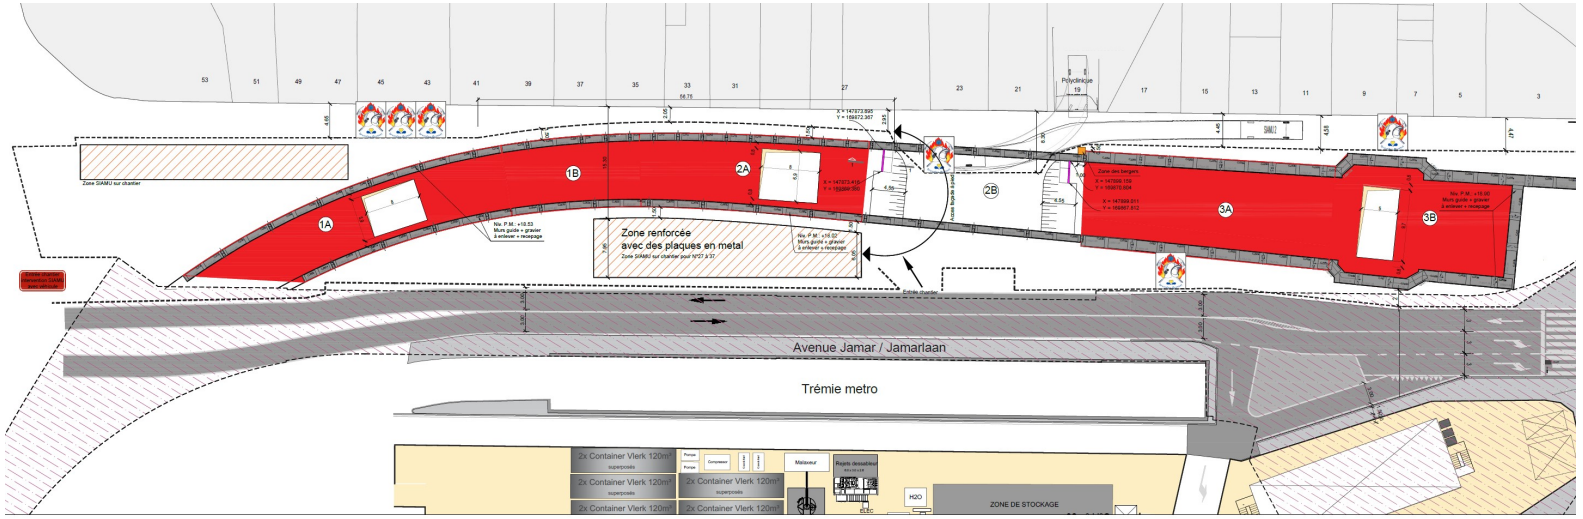

VUE EN PLAN acces SIAMU phase 2: 01/02/2023 - 30/04/2023

Échelle: 1:200

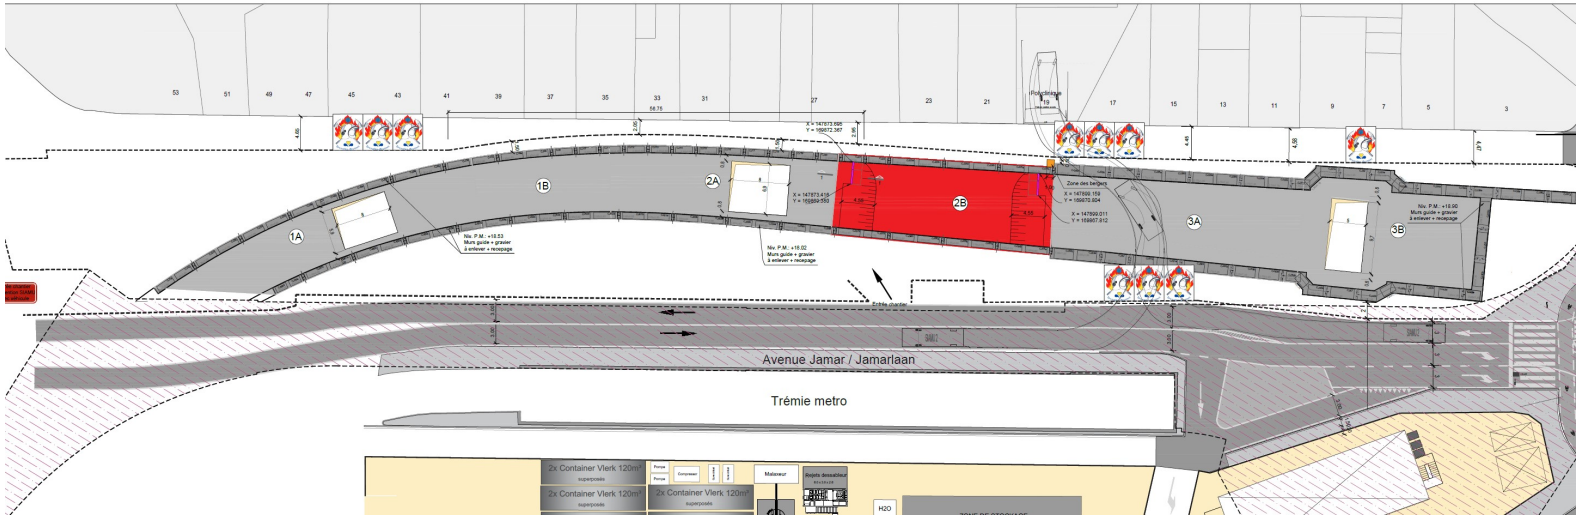

M3 Nord - Albert

Impact des travaux sur le réseau STIB

- Travaux en tunnel avec interruption de l'exploitation le 29/10/2022 des T3-T4-T51-T82 toute la journée

ref PRES

Explication travaux de recépage

- Etape entre parois moulées et dalle de toiture
- Nuisances sonores
- Etape nécessaire pour connecter les armatures des parois et de la dalle de toiture

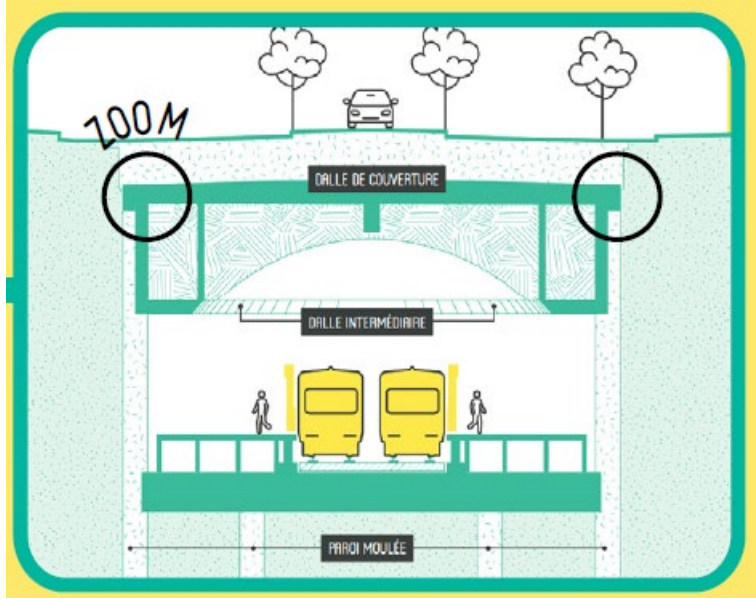

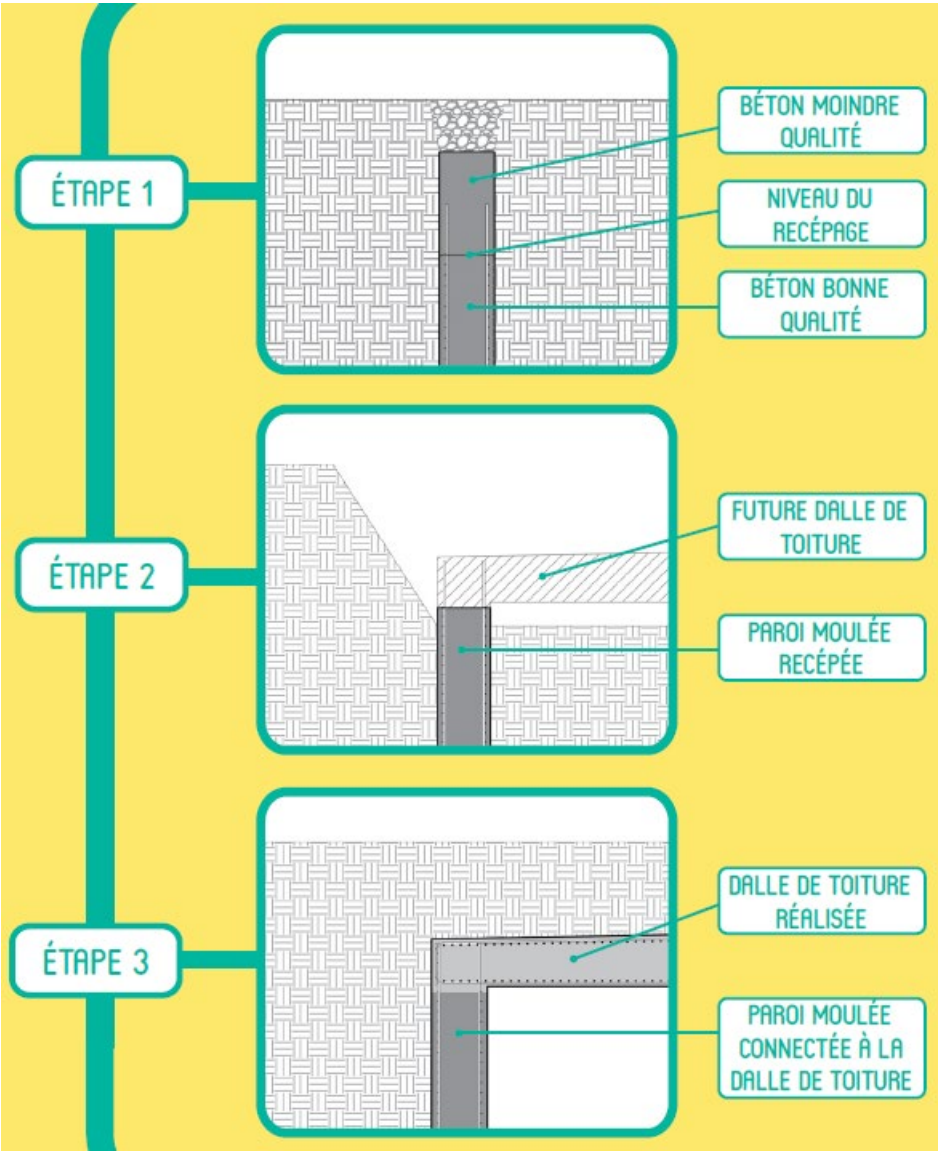

2

Mesures d’accompagnement

Laurent Vermeersch
Kevin Van Den Hout

M3 Nord - Albert

MIVB STIB .brussels
béliris POUR BRUXELLES VOOR BRUSSEL
BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

Propreté

- Suppression du point de collecte situé Stalingrad côté impair => remplacé par un ramassage porte à porte
- Quartier est considéré comme prioritaire par la Ville de Bruxelles
- Service propreté a engagé 6 personnes supplémentaires pour assurer des ramassages quotidiens, en plus des collectes de Bruxelles Propreté

Plan cheminement piéton

- Choix pragmatique: réalisation et placement STIB
- Bâches + panneaux

100 jaar Toots Thielemans

- 9 concerten in handelszaken in de buurt
- Expo op de werfhekken in de zone Stalingrad
- Aankleding van gebouw Zuidlaan 63
- Aanwezigheid van de ‘reus’ Toots bij de opening van de Zuidfoor.

TOOTS
100

100 YEARS
TOOTS
THIELEMANS
1922
2022
sabam
for culture
visit.brussels
KBR
www.metro3.be

100
YEARS
1922
2022
TOOTS
M3
Bordet-
Albert

Nouvelles bâches

- Installation de nouvelles bâches sur Jamar + nettoyage de bâches sales
- Enlèvement d'une partie des bâches suite aux soucis d'insécurité
- Remplacement des bâches les plus anciennes sur la zone Lemonnier
- Possibilité de récupérer des bâches anciennes (photo historiques)

M3 Bordet-Albert

Vergroening

- Nieuwe aanplantingen in bestaande bakken
- Inspanningen om regelmatig water te geven
- Vraag naar meer: overleg met groendiensten
- Bestaande initiatieven: samenvergroenen.brussel.be / vegetalisons.bruxelles.be

Embellissement pont de chemin de fer

- Installation de deux photos M-F. Plissart côté St-Gilles
- Panneau informatif et éclairage des œuvres en préparation
- Prochaine étape: guirlandes sur le pont

Eindejaarsverlichting

- Versterken van de verlichting onder de brug (valorisatie van kunstwerken)
- Sfeerverlichting op de brug
- Sfeerverlichting op de werfhekken

Réflexion animations 2023

- Evénements dans Palais du Midi, Atelier des Tanneurs…
- Retour de la brocante
- Intégration dans programmation de la Ville à l'ouverture de terrass (Enjoy The City)
- Visites de chantier

hub.brussels – coachings

En cours

- Création des sites internet en cours pour 15 commerçants dont les deux associations de commerçants locales
- Soutien au référencement avec Google 360
- Accompagnement Stalem
- Session d'information avec le GEL Dansaert
- Mise en valeur des commerçants labelisés du quartier avec Entreprendre

Clean-up Day

- SM Toots nam deel aan World Clean Up Day eind september
- Voorstel om dit te herhalen op regelmatige basis met ploegen MIVB, HUB en eventueel buurtbewoners, scholen enz.
- Ondersteuning van de Dienst Netheid Stad Brussel
- Interesse? Contacteer ons ombudsmanM3@mivb.brussels

Définir de nouveaux thèmes d'habillage

- Info projet + Images des stations de la ligne M3
- Réaménagement de surface
- Habillage esthétique: appel à projet ;
  propositions bienvenues
  ombudsmanM3@stib.brussels
- Mise en place 2023

Rappel des canaux de communication

- ombudsmanM3@stib-mivb.brussels
- 0490 52 38 98
- WhatsApp
- Point Info M3

  boulevard Lemonnier 124

  Permanence lundi 9 – 12h
- www.metro3.be et newsletter

3

Gestion des points d'amélioration

Samir Benelcaïd

M3 Nord - Albert

MIVB STIB .brussels
béliris POUR BRUXELLES VOOR BRUSSEL
BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

Gestion des points d'amélioration

- **Etat d'avancement**

Total pour 2022 : 84 Plaintes

Mois	Nombre
Janvier	14
Février	16
Mars	8
Avril	12
Mai	7
Juin	9
Juillet	4
Aout	6
Septembre	8
Octobre	6

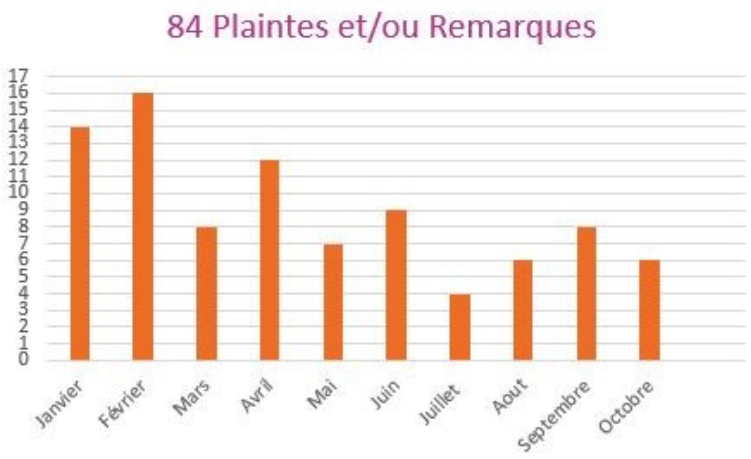

Status

Open:	12
Closed:	72

Total par type

Plainte	Nombre
Question	10
Remarque	8
Mobilité	11
Sécurité	10
Propreté	34
Stationnement	6
Poussières/Boue	15
Vibrations	15

ref PRES

Gestion des points d'amélioration

- **Etat d'avancement**

Plaignant par catégorie	
Habitants	28
Commerce	48
Entreprise	4
Cycliste	2
Voyageur STIB	0
Automobiliste	0
Passant	1
Voyageur SNCB	1

ref PRES

Merci de votre attention

M3 Bordet-Albert

MIVB STIB .brussels

beliris POUR BRUXELLES VOOR BRUSSEL

BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
